


Novo SEIA | Plano de Go-Live

Planejamento reverso ancorado em 07 de dezembro de 2026

NOVO SEIA - PLANO GO-LIVE (planejamento reverso ancorado em 07 de dezembro de 2026)

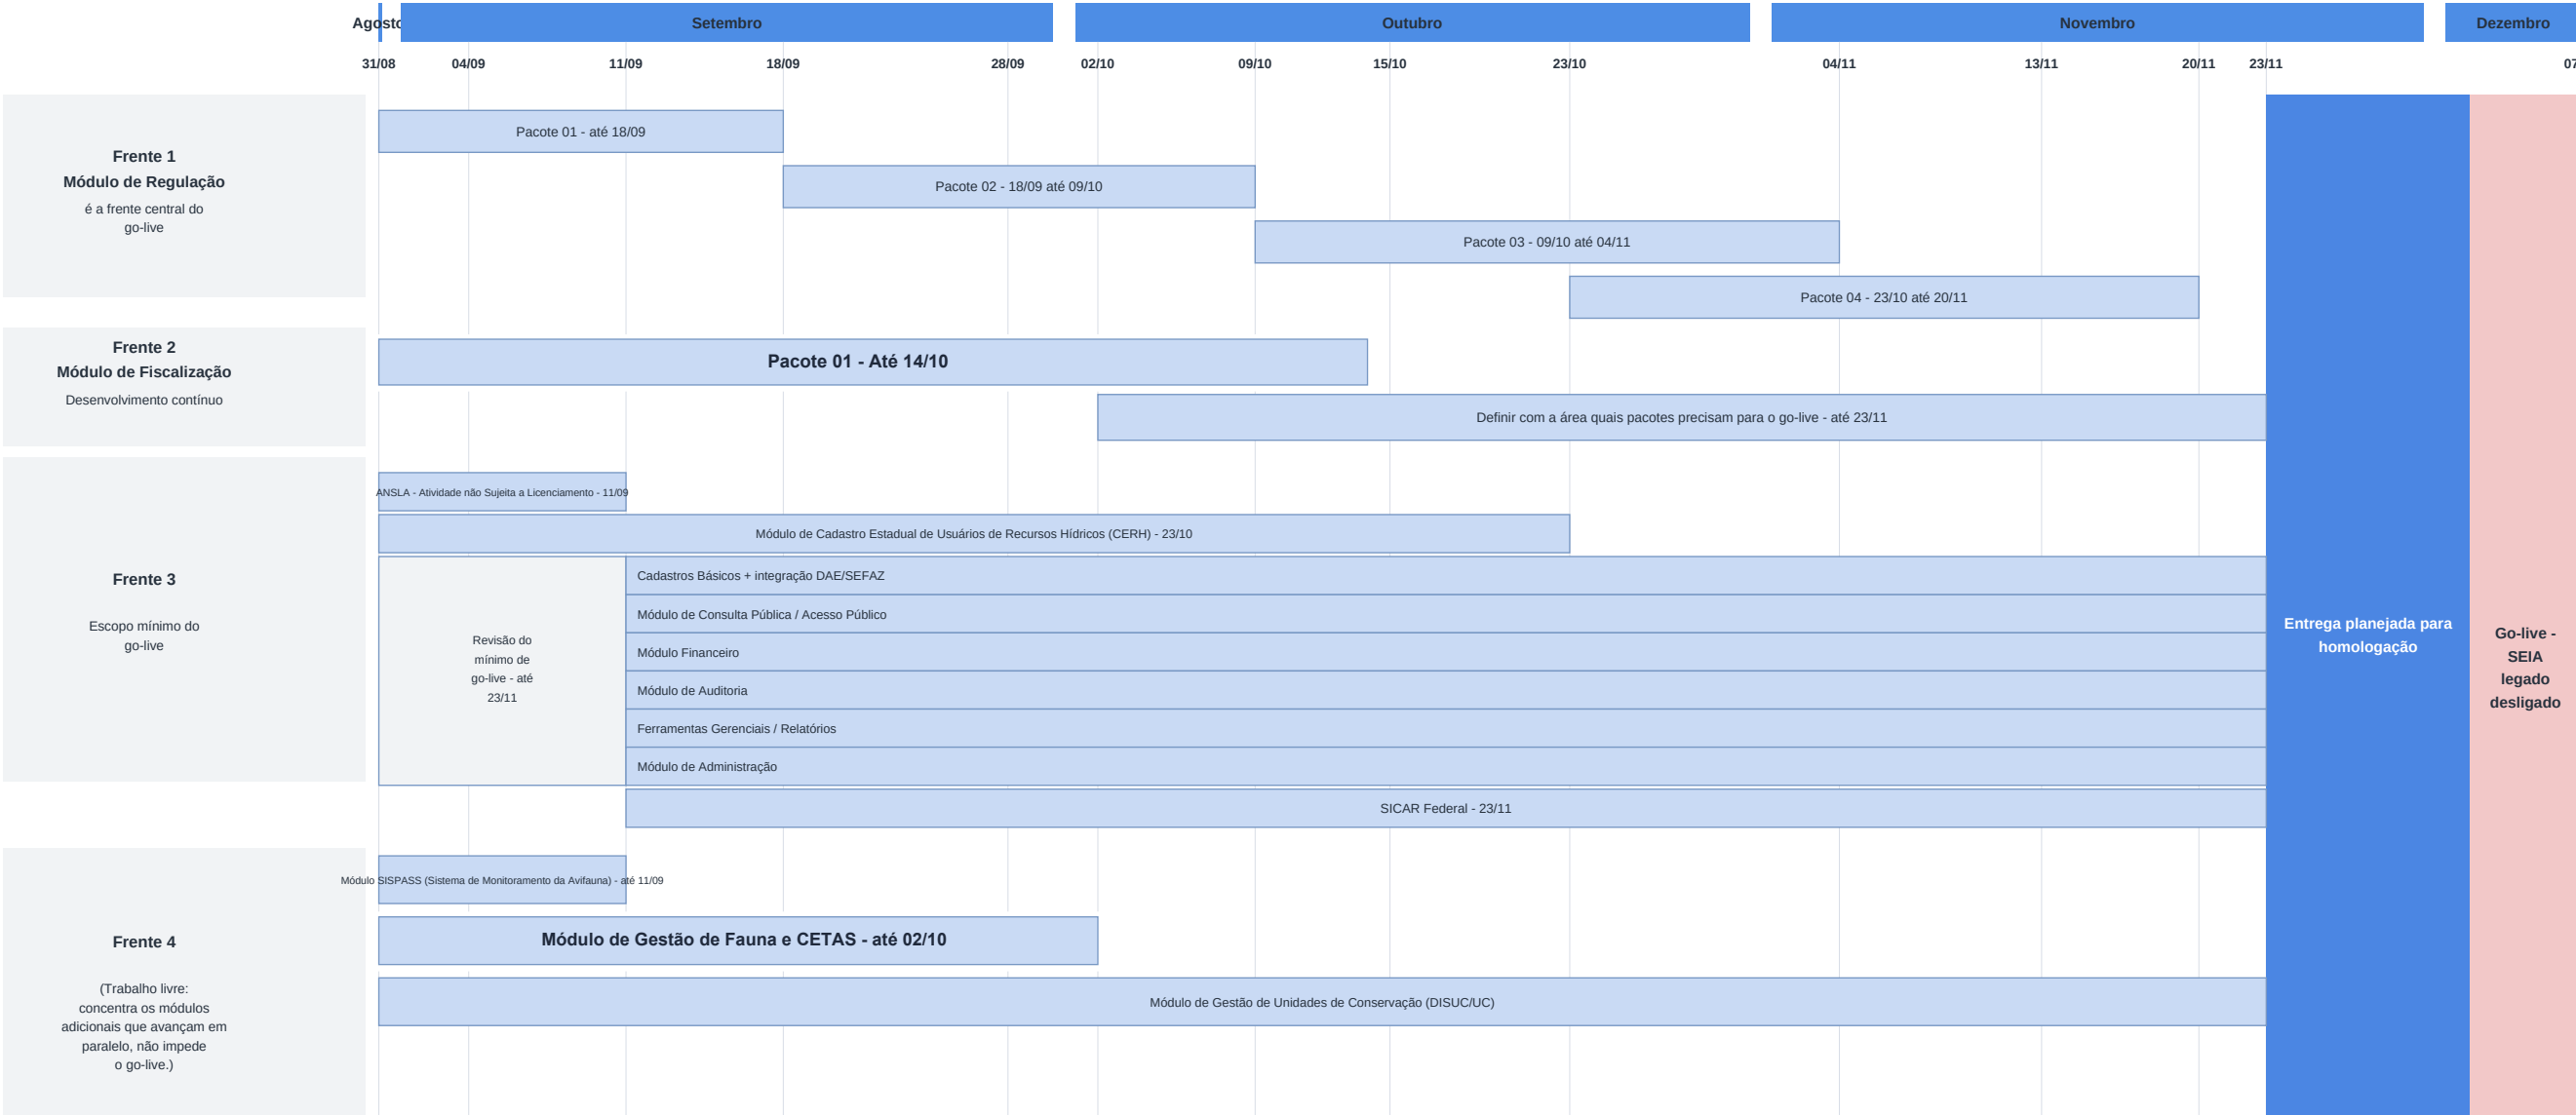

LEGENDA

Atividades e entregas das frentes

Marcos críticos do plano

MARCOS PRINCIPAIS

23/11

Entrega planejada para homologação

07/12

Go-live - SEIA legado desligado

NOTA

As frentes 1, 2 e 3 são os pontos focais e prioridades para o go-live. A frente 4 seguirá em paralelo.

CALENDÁRIO MESTRE DE DATAS | NOVO SEIA

Planejamento reverso ancorado no go-live em 07/12/2026

Data	Dia	O que vence / Marco	Frente	Tipo
11/09	Sex	ANSLA - Atividade não Sujeita a Licenciamento	3	Entrega
11/09	Sex	Módulo SISPASS (Sistema de Monitoramento da Avifauna)	4	Entrega
18/09	Sex	Módulo de Regulação Pacote 01	1	Entrega
18/09	Sex	Módulo de Regulação Início do Pacote 02	1	—
02/10	Sex	Módulo de Gestão de Fauna e CETAS	4	Entrega
09/10	Sex	Módulo de Regulação Pacote 02	1	Entrega
09/10	Sex	Módulo de Regulação Início do Pacote 03	1	—
14/10	Qua	Módulo de Fiscalização Pacote 01	2	Entrega
23/10	Sex	Módulo de Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos (CERH)	3	Entrega
23/10	Sex	Módulo de Regulação Início do Pacote 04	1	—
04/11	Qua	Módulo de Regulação Pacote 03	1	Entrega
20/11	Sex	Módulo de Regulação Pacote 04	1	Entrega
23/11	Seg	Fiscalização Definir com a área quais pacotes precisam para o go-live	2	Entrega
23/11	Seg	Revisão do mínimo de go-live	3	Entrega
23/11	Seg	SICAR Federal	3	Entrega
23/11	Seg	Entrega planejada para homologação	—	Marco crítico
07/12	Seg	Go-live - SEIA legado desligado	—	Marco crítico

